

Informe Ejecutivo de Avance: Proceso de Recibo Zonas Comunes

Iconik 68

Marzo 2026



CONSTRUCCITY

Presentado al Consejo de Administración por Construcccity



01. Velocidad de Ejecución

El cronograma presenta un adelanto estratégico de aproximadamente dos (2) semanas respecto al contrato original.



02. Detección de Riesgos

Identificación proactiva de vicios ocultos críticos, incluyendo riesgos de electrocución, deficiencias funcionales y discrepancias con licencias.




03. Herramientas de Negociación

Consolidación de evidencia forense, estructuración en la nube (Drive) y modelado 3D para empoderar al Consejo frente a la constructora.



Ventaja Estratégica en Tiempos de Ejecución

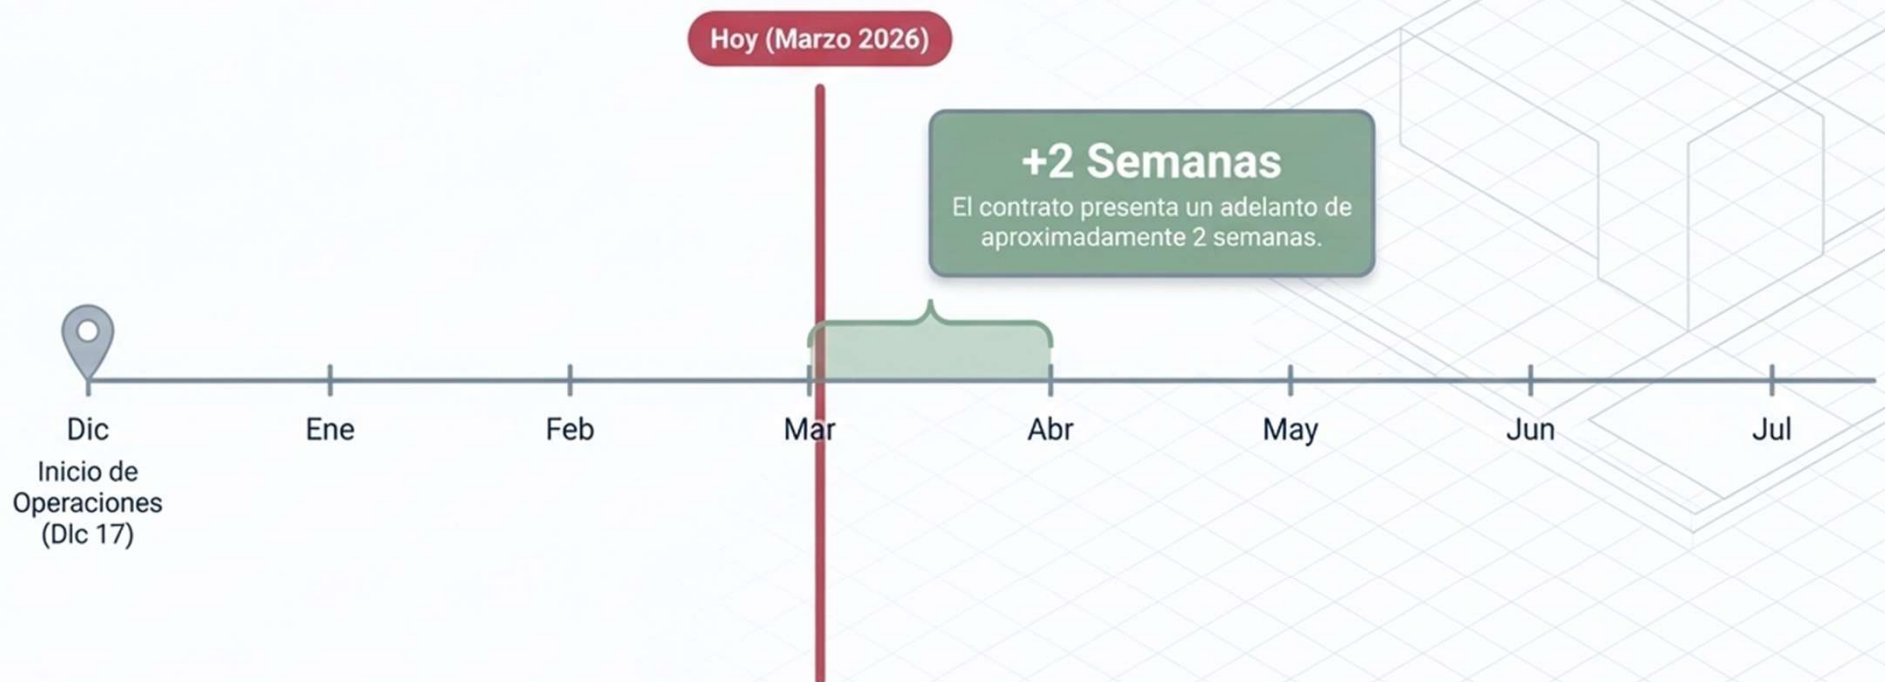

Nota: El cronograma depende de la velocidad de respuesta de la constructora, pero la proactividad actual nos otorga un margen de maniobra.

Huella Operativa de Auditoría en Sitio (Dic 2025 - Mar 2026)



Redes e Infraestructura Crítica

Cuartos de tableros, redes eléctricas, redes hidráulicas, sistemas de detección de incendios.

Estructura y Puntos Fijos

Sótanos, pasillos, escaleras, puertas de emergencia, cubiertas, ascensores.

Amenidades y Zonas Sociales

Oficina de administración, cancha de squash, cubierta de centro comercial, playground.

Más de 15 jornadas intensivas conjuntas y autónomas ejecutadas hasta la fecha.

Hallazgo Crítico 01: Riesgo de Electrocución y Redes Irregulares

Ubicación: Cuarto de Tableros (Torre 1)



● ALTO RIESGO: SEGURIDAD VITAL




Se evidenció a la constructora el riesgo inminente de electrocución y la existencia de conexiones irregulares provenientes de la obra.
Peligro directo para el personal y residentes. Requiere intervención y corrección inmediata por parte de la constructora antes de cualquier firma.

Hallazgo Crítico 02: Geometría Deficiente en Shut de Basuras

Ubicación: Pasillos Torre 1 vs. Torre 2

● RIESGO OPERATIVO:
DEFICIENCIA FUNCIONAL

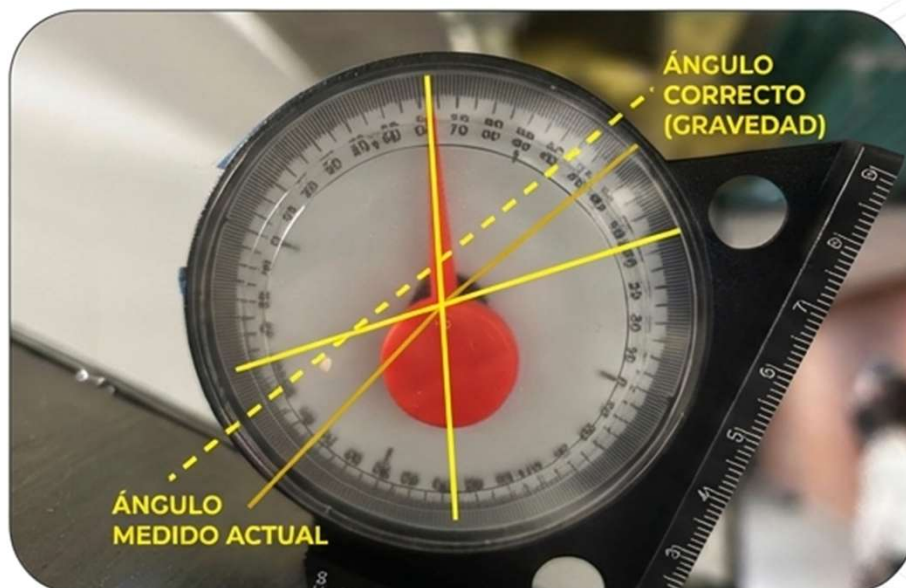

Mediante medición técnica, se validó que el shut de la Torre 1 tiene sustancialmente menos pendiente que el de la Torre 2.

Esta deficiencia en la inclinación dificultará gravemente la caída por gravedad de las bolsas de basura, generando atascos constantes, problemas de salubridad y sobrecostos de mantenimiento.

Hallazgo Crítico 03: Inconsistencias de Uso en Cubiertas

Ubicación: Cubierta Centro Comercial

ALERTA LEGAL: DISCREPANCIA NORMATIVA



Contraste entre realidad física y soporte documental.

En la revisión cruzada con la licencia de construcción aprobada, NO aparece el uso de esta zona como 'terraza transitable'. Esto representa un riesgo legal y de seguros para la copropiedad si se habilita para tránsito de residentes sin el aval normativo correcto.

● OPERATIVO CON OBSERVACIONES MENORES

Verificación de Puntos Fijos y Sistemas de Emergencia



Se verificó la operatividad de los equipos de emergencia (Red Contra Incendios e iluminación). El sector cumple con los estándares de entrega y seguridad exigidos.



Aún quedan pendientes detalles de obra blanca y acabados estéticos (fisuras, rejillas rotas, herrajes de puertas) que la constructora debe subsanar.

Matriz de Estado de Entregas (Recibido vs. Por Recibir)

Etapa / Zona	Tipo de Equipamiento	Estado Actual	Observación Legal
Etapa I	Zonas Comunes NO Esenciales	Recibidas y puestas en funcionamiento.	Completado.
Etapa I	Zonas Comunes ESENCIALES	En negociación por múltiples hallazgos.	Bloqueado. En estructuración de informe para presionar a la constructora (Ej: Piso plazoleta, Shuts de basuras).
Etapa II	Todas las Zonas	No iniciada aún.	En etapa de terminación de obra por parte de la constructora.

Arquitectura de la Información: Blindaje Documental

Todo el proceso no se limita a observaciones verbales. Hemos estructurado un repositorio en la nube (Drive) riguroso y clasificado.



- **Trazabilidad Total:** Cada hallazgo está respaldado por fecha, registro fotográfico y normativa aplicable.

- **Estructuración de Informes:** Consolidación de informes técnicos de medios de evacuación y vicios ocultos.

- **Ventaja Táctica:** Este repositorio es la herramienta principal que utilizará la Administración y el Consejo para exigir garantías sin que la constructora pueda refutar los hechos.

Valor Agregado: Modelo Tridimensional Volumétrico

Construcccity está desarrollando un gemelo digital/modelo 3D de la volumetría del conjunto Iconik 68.

Facilita el análisis espacial unificado para el Consejo de Administración.

Herramienta visual definitiva para la toma de decisiones estratégicas.

Base de datos visual a futuro para mantenimiento y gestión de la copropiedad tras la entrega final.

